#### Разработка приложения ГеоКвест.Барнаул

27 мар. 2025 г.

http://kuchin.myspt.ru

#### Лаборатория разработки Webсервисов

Управляющий проектом

**Сроки проекта** 31 янв. 2025 г. - 13 мая 2025 г.

Выполнено9%Задачи58Исполнители2

Создание игрового веб-приложения, которое позволит пользователям угадывать места в городе Барнаул, основываясь на панорамах.

Название	Дата начала	Дата окончания
Инициация	31.01.2025	04.02.2025
Подготовка устава проекта	31.01.2025	01.02.2025
Формирование официального документа, определяющего цели, задачи, критерии успеха и границы проекта.		
Написание коммерческого предложения Подготовка документа, содержащего описание идеи, ценности, выгод, сроков и предварительной оценки стоимости проекта для заказчиков и инвесторов.	31.01.2025	03.02.2025
Идентификация и регистрация стейкхолдеров Определение всех заинтересованных сторон, их ролей и ожиданий от проекта.	01.02.2025	04.02.2025
Планирование	05.02.2025	22.03.2025
Планирование управления содержанием Разработка подхода к сбору и документированию требований, выбор методов и инструментов.	05.02.2025	06.02.2025
Сбор детальных требований  Интервью со стейкхолдерами, формирование списка функциональных и нефункциональных требований.	06.02.2025	11.02.2025
Уточнение приоритетов функционала	11.02.2025	15.02.2025
Расстановка приоритетов по пользовательским историям с учётом бизнес-ценности.		
Создание структуры содержания проекта (WBS) Разбиение проекта на блоки задач и подзадачи. Создание структуры содержания проекта (WBS) Формирование иерархической структуры задач (WBS) Создание структурированного перечня задач проекта (WBS) Определение содержания работ проекта (WBS)	17.02.2025	19.02.2025
Определение зависимостей Установка логических связей между задачами (что за чем идет, где возможна параллельная работа).	19.02.2025	20.02.2025
Оценка необходимых ресурсов операций Выявление требуемых компетенций, людей и инструментов для выполнения проекта	20.02.2025	21.02.2025
Разработка графика проекта (Gantt) Формирование календарного плана, согласование сроков и распределение ресурсов.	22.02.2025	24.02.2025

Название	Дата начала	Дата окончания
Планирование распределения ролей Определение ролей и зон ответственности, составление RACI-матрицы при необходимости.	25.02.2025	26.02.2025
Определение плана коммуникаций Определение частоты и формата встреч, отчетов и рассылок.	26.02.2025	26.02.2025
Настройка инструментов для общения Настройка Slack/Telegram, Trello/Jira, репозитория (GitHub/GitLab) и других инструментов.	26.02.2025	26.02.2025
Идентификация рисков Составление списка возможных рисков (технических, организационных и т.д.).	28.02.2025	01.03.2025
Анализ рисков Оценка вероятности и влияния каждого риска.	03.03.2025	04.03.2025
Разработка плана реагирования Определение стратегий реагирования (избежать, смягчить, принять) и разработка резервных планов.	04.03.2025	05.03.2025
Согласование бюджетов Уточнение стоимости и распределение бюджета на предполагаемые закупки.	07.03.2025	10.03.2025
Определение критериев качества Определение требований к функционалу и интерфейсу для достижения заданного уровня качества.	11.03.2025	12.03.2025
Планирование проверок качества Разработка плана тестирования, проведения код-ревью и сбора метрик качества.	13.03.2025	14.03.2025
Разработка плана управления проектом Составление единого документа, объединяющего все управленческие планы (содержание, сроки, затраты, качество, коммуникации, риски и т.д.).	15.03.2025	20.03.2025
Постановка задач(уже переход в фазу исполнения) Формирование и назначение конкретных задач в таск-трекере (например, Jira, Trello), определение сроков и ответственных исполнителей.	21.03.2025	22.03.2025
Разработка дизайна и пользовательского интерфейса	21.03.2025	28.03.2025
Скетчи и прототипы интерфейса Создание прототипов основных экранов, отображающих логику работы и расположение элементов.	21.03.2025	25.03.2025

4

Название	Дата начала	Дата окончания
Создание дизайн-системы Определение стилей, палитры, шрифтов и компонентов для единообразного интерфейса.	26.03.2025	28.03.2025
Настройка инфраструктуры Настройка серверного окружения Выбор и настройка хостинга (VPS/облако), настройка баз данных.	21.03.2025 21.03.2025	28.03.2025 25.03.2025
Разворачивание VCS(Git) Разворачивание репозитория на github.	26.03.2025	26.03.2025
Настройка CI/CD Автоматизация процессов сборки и деплоя	26.03.2025	28.03.2025
Мониторинг и логирование  Настройка систем логирования и мониторинга производительности и ресурсов	26.03.2025	28.03.2025
Фронтенд-разработка Настройка проекта (frontend)	29.03.2025 29.03.2025	23.04.2025 31.03.2025
Инициализация проекта, настройка окружения Реализация основных экранов Разработка ключевых страниц: панорама, карта, окно для угадывания локации, результаты.	01.04.2025	11.04.2025
Адаптивная верстка и UI-детали Обеспечение корректного отображения на разных устройствах, а также реализация анимаций и эффектов.	12.04.2025	17.04.2025
 Интеграция с АРІ бэкенда Подключение запросов и обработка ответов сервера (локации, результаты, авторизация и пр.).	18.04.2025	23.04.2025
Бэкенд-разработка	29.03.2025	25.04.2025
Архитектура сервера и базы данных Выбор фреймворка, проектирование структуры проекта и схемы базы данных (хранение локаций, пользователей и т.д.).	29.03.2025	02.04.2025

Название	Дата начала	Дата окончания
Реализация REST API Создание эндпоинтов для авторизации, получения списка локаций, проверки ответов пользователя и пр.	03.04.2025	14.04.2025
Интеграция с панорамами/картами Настройка работы с API сторонних сервисов (Яндекс.Панорамы).	15.04.2025	19.04.2025
Обеспечение безопасности  Настройка механизмов безопасности: JWT/OAuth, шифрование данных, валидация запросов.	21.04.2025	25.04.2025
Тестирование	02.04.2025	02.05.2025
Разработка плана тестирования Определение видов тестов (модульные, интеграционные, end-to-end) и критериев приемки.	02.04.2025	03.04.2025
Написание тест-кейсов Создание конкретных сценариев тестирования функционала (угадывание локации и пр.).	04.04.2025	07.04.2025
Функциональное тестирование Проверка корректности работы ключевых функций (регистрация, авторизация, угадывание локации и пр.).	18.04.2025	28.04.2025
Нагрузочное/стресс-тестирование Оценка производительности и устойчивости приложения при пиковых нагрузках.	23.04.2025	29.04.2025
Приёмочное тестирование Финальная проверка готовности продукта к релизу.	30.04.2025	02.05.2025
Закрытие	03.05.2025	12.05.2025
Финальное приемочное тестирование	03.05.2025	05.05.2025
. Проведение итоговой проверки по всем критериям готовности и формальное подтверждение качества продукта.		
Обучение и передача продукта стейкхолдерам Демонстрация работы приложения, предоставление инструкций по эксплуатации и сбор обратной связи.	06.05.2025	07.05.2025
Итоговый отчёт по проекту Документирование результатов, выявленных проблем и рекомендаций по улучшению.	08.05.2025	10.05.2025

Название	Дата начала	Дата окончания
Формальное закрытие проекта	12.05.2025	12.05.2025
Подписание необходимых документов, архивация материалов, расформирование команды (при необходимости).		
Мониторинг и контроль	05.02.2025	12.05.2025
Отслеживание статуса задач	05.02.2025	12.05.2025
Регулярные встречи (стендапы, ретро), обновление статуса в таск-трекере (Jira/Trello) на протяжении проекта.		
Контроль рисков	05.02.2025	12.05.2025
Отслеживание выявленных рисков и реализация плана реагирования при необходимости.		
Контроль качества	05.02.2025	12.05.2025
Проведение промежуточных проверок (тесты, код-ревью, мониторинг метрик).		
Контроль изменений и версий	05.02.2025	12.05.2025
Утверждение запросов на изменение функционала/дизайна, ведение версий приложения.		
Контроль бюджета	05.02.2025	12.05.2025
Сверка фактических затрат с плановыми, корректировка бюджета по мере необходимости.		

6


### Исполнители

мя	Стандартная роль
Тимур Кучин	Менеджер проекта
Шульга Ольга	Бэкенд-разработчик

7

**GanttChart** 

8

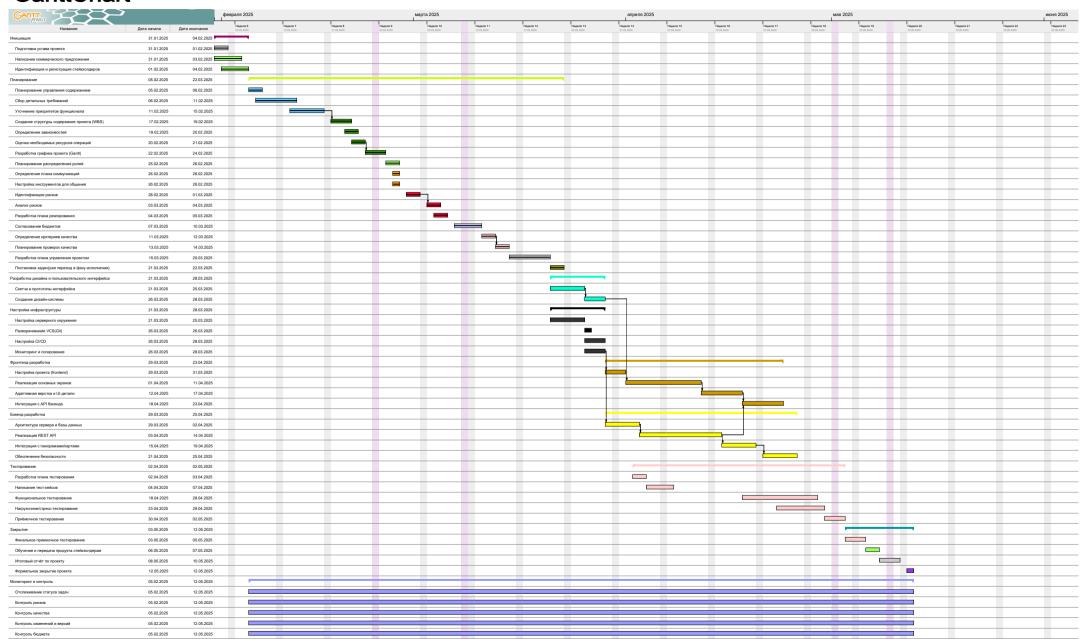

9

Занятость ресурсов

